

Main planned TCRs in Atlantic Corridor (ADIF network)



March 2026

Centro (1)

Línea 200


Hortaleza-Aeropuerto T4


(2021-1-004)

3^{er} trim 2024 - 2^o trim 2026

Acceso al Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suarez en ancho estándar.

- Enero 2026: 9 cortes nocturnos en BM.
- Del 7/02/26 al 16/03/26: Corte de 1,5 meses vía 1 trayecto Aeropuerto - Hortaleza, generando además corte total en L200 de Hortaleza a O´Donnell del 28/02/26 al 16/03/26.

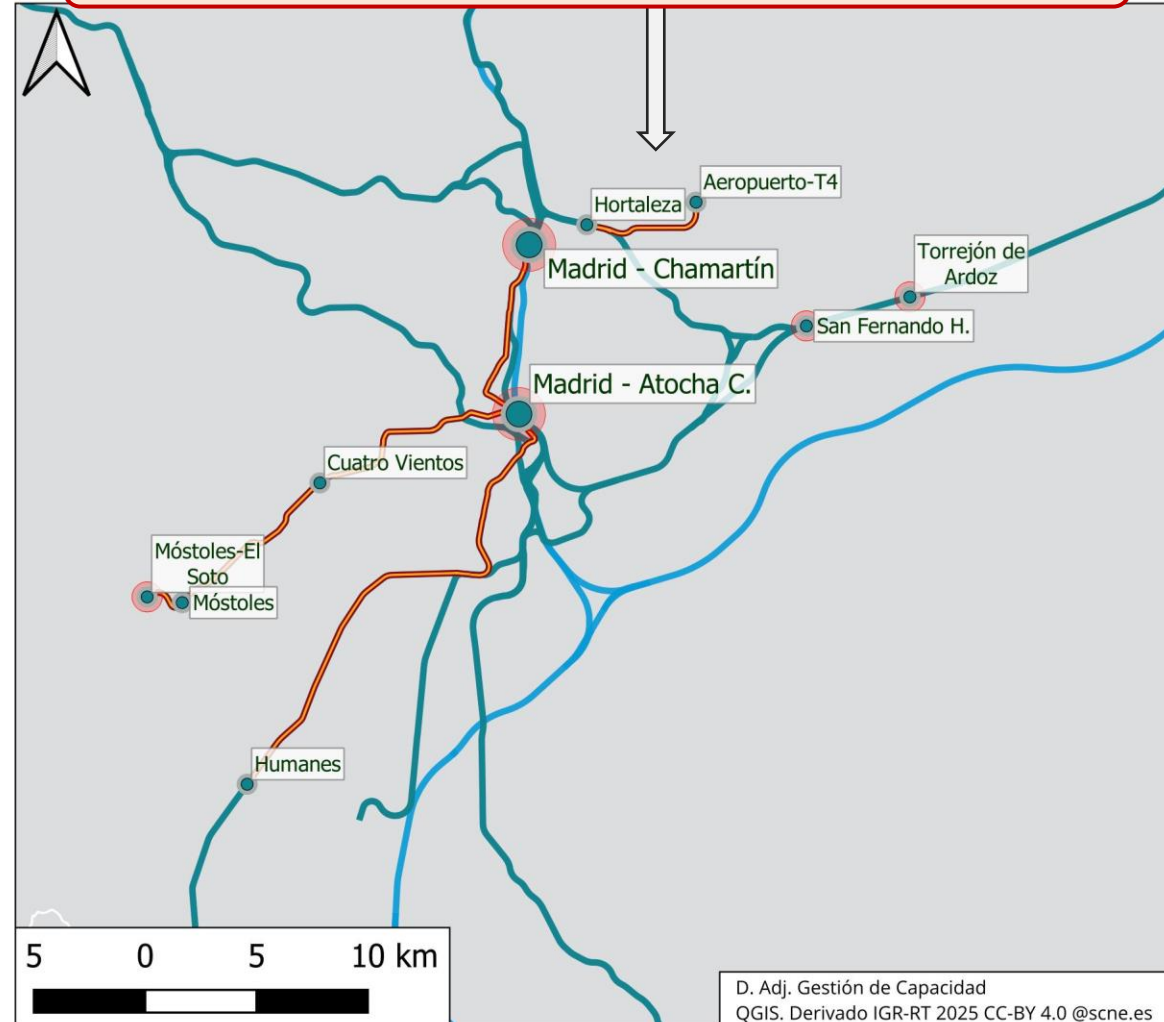

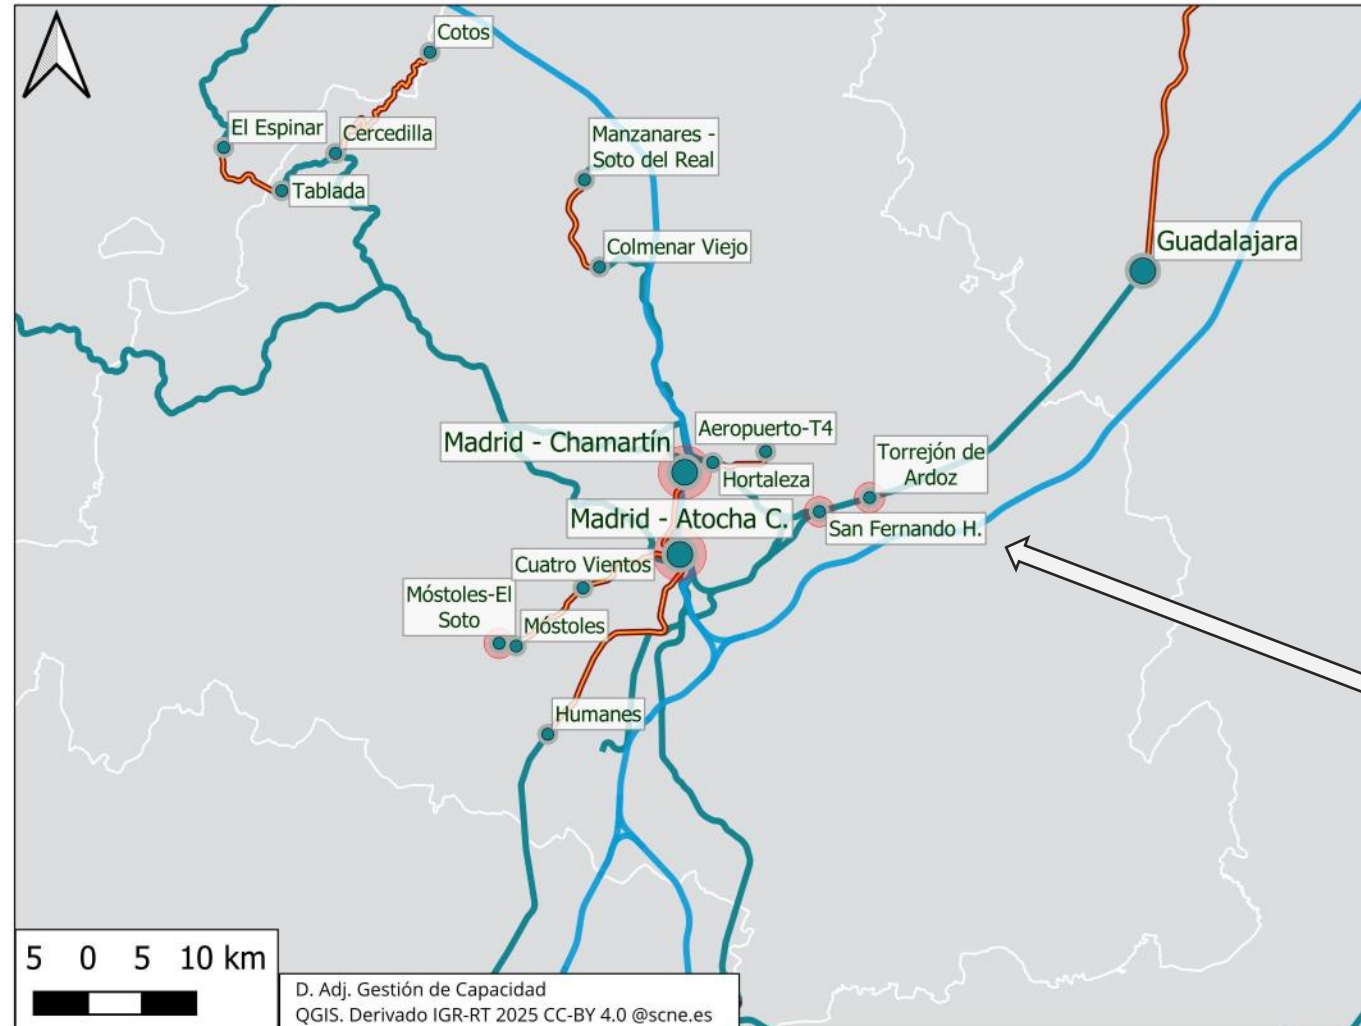


Línea 200
Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares (2025-1-005)

2027
Remodelación de las estaciones de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares.

- Restricción de longitud en estacionamiento vía 1 de San Fernando durante 68 días.
- Corte de vía 2 de Torrejón durante 50 días.
- Corte de vía 1 de Torrejón durante 37 días.
- Corte acceso a Torrejón Mercancías durante 18 días.

Centro (3)

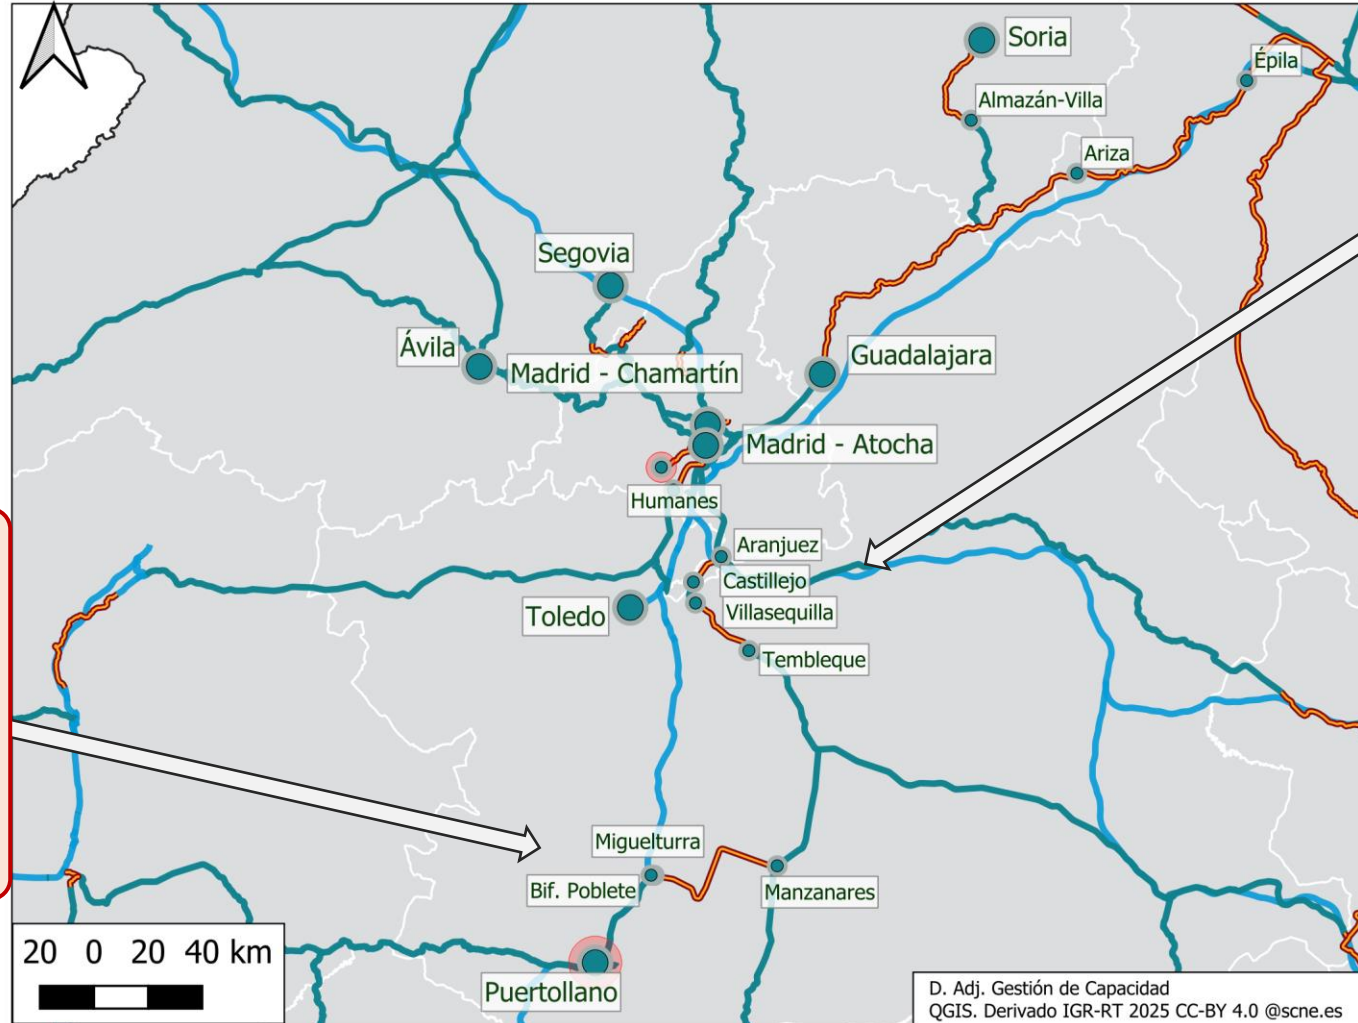

Línea 522 Manzanares - Miguelturra - Bif Poblete (2025-1-009)

2027

Autopista Ferroviaria Manzanares-Badajoz.

- Cortes totales de hasta 11 días y trabajos en BM con intervalo adicional en diferentes puntos del tramo.
- Los cortes totales serán simultáneos.


Línea 300

Aranjuez - Castillejo (2022-1-002)


4º trim 2027 - 2º trim 2028

Estabilización de terraplén.

- Corte de vía alterna durante 9 meses.
 - 4 meses vía 2.
 - 5 meses vía 1.
- Durante esos 9 meses, 3h/día corte simultáneo de ambas vías en BM.
- LTV vía contigua.

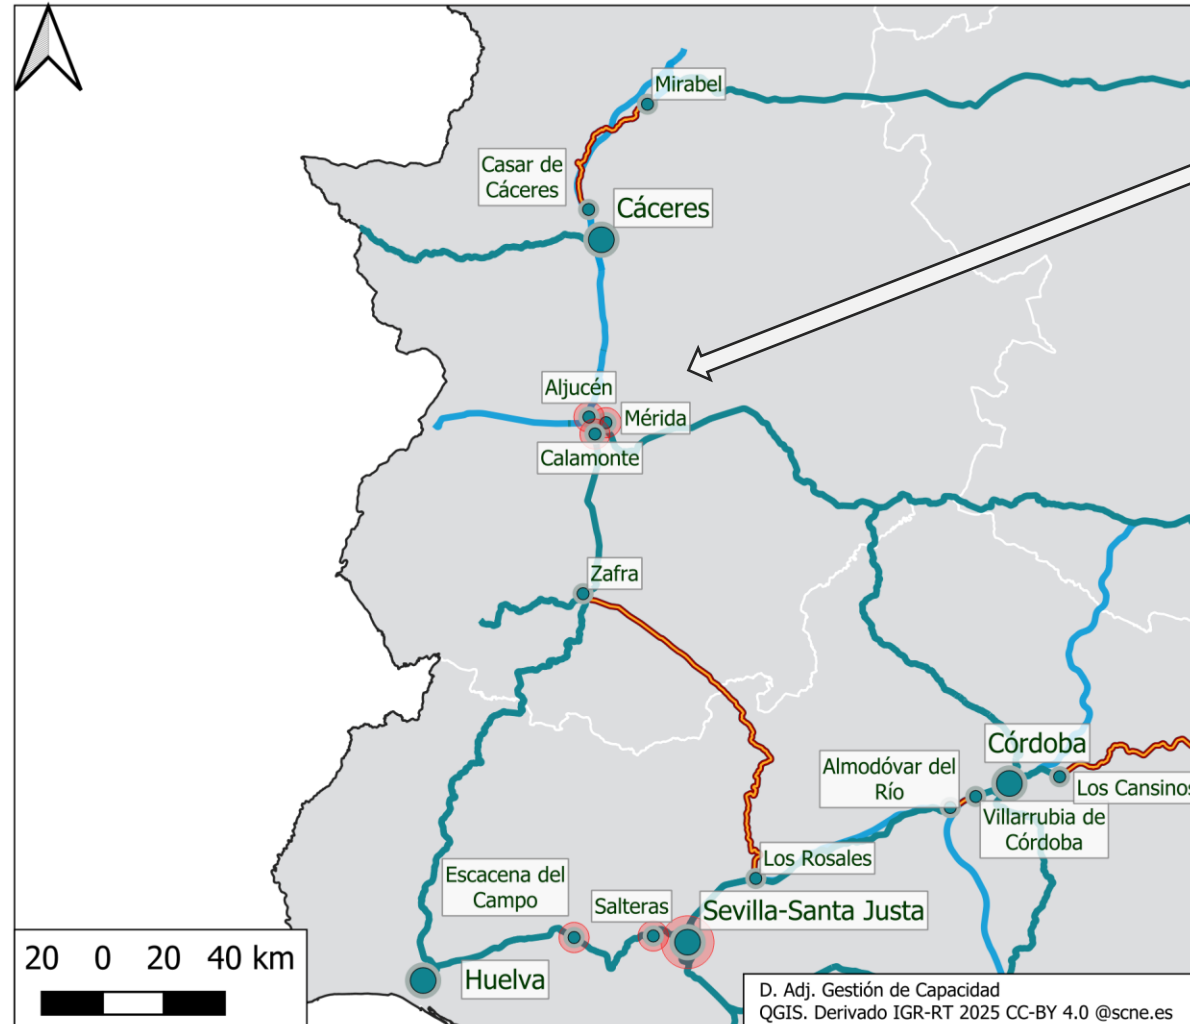

Línea 520
Mérida - Aljucén (2023-3-011)
Se pospone, fecha en estudio (propuesta de ejecución en 2027).
Proyecto constructivo para conexión en Mérida, plataforma y vía.
• Corte total. Coordinado para no solaparse con autopista ferroviaria (id. 2023-3-022)

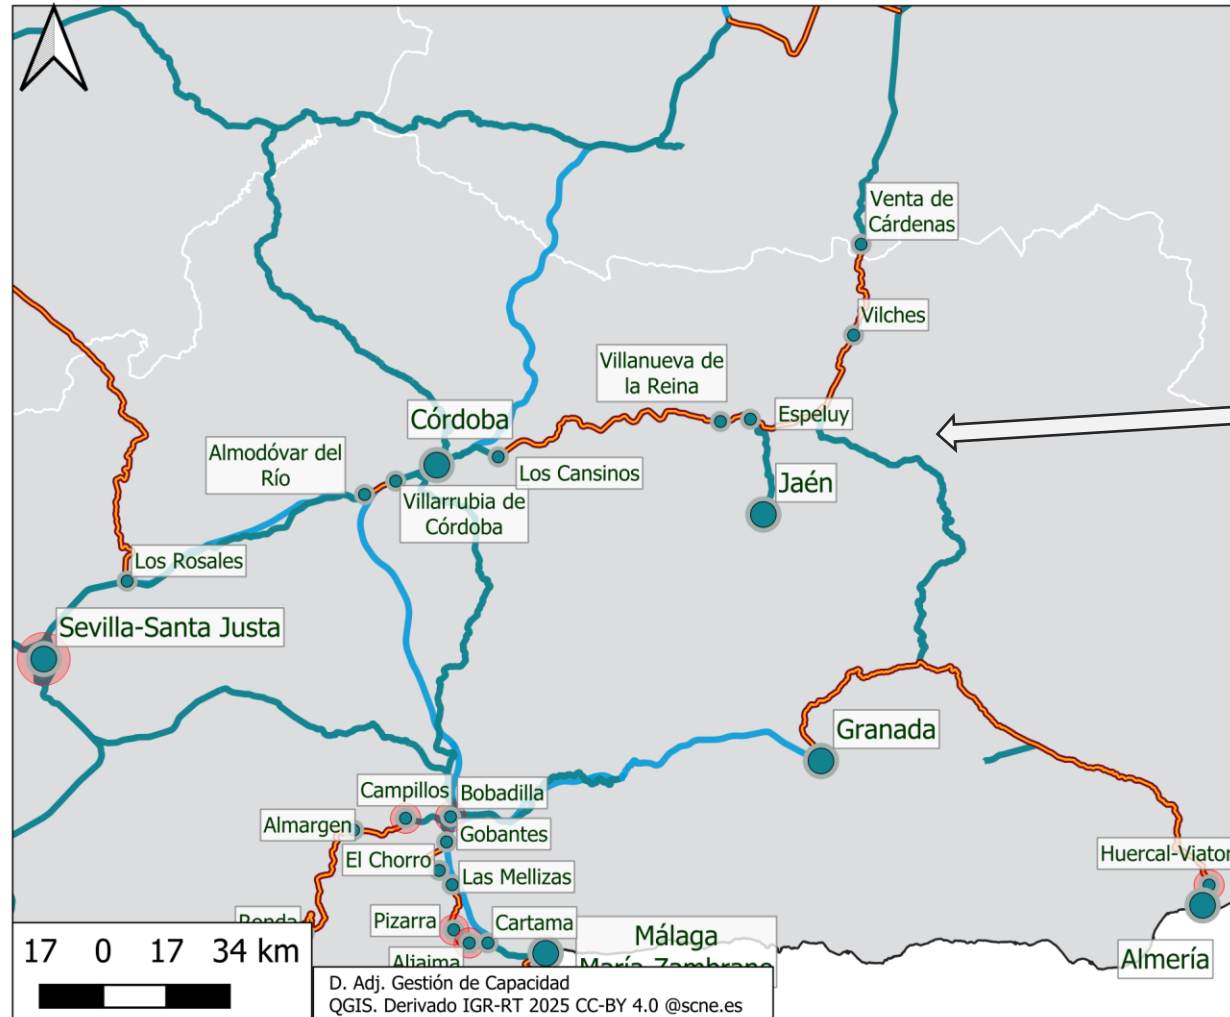

Línea 400 (Pendiente replanificación fechas)

Obras vinculadas a la Autopista ferroviaria Zaragoza - Algeciras

Las fechas para los trabajos tienen una duración prevista de 14 meses, desde julio de 2026 hasta septiembre de 2027.

Venta de Cárdenas - Los Cansinos (2023-3-022)

Adecuación de gálibo de 13 túneles.

- Corte total: Comenzará tras el corte de la Autopista Ferroviaria Guadalajara - Épila. Pendiente definir fecha.

Otras obras contenidas en el corte:
Trabajos en terraplén y taludes, reparación y sustitución de puentes metálicos y viaductos:
(2023-3-016, 2023-3-017; 2023-3-021; 2024-3-010; 2024-3-011; 2025-3-004, 2025-3-005)

Sur (3)

Línea 420 (Pendiente de replanificación de fechas)

Las fechas para los trabajos de la L420 tienen una duración prevista de 13 meses entre abril de 2026 y junio de 2027.

Ronda – Campillos (2023-3-005)

2º trim. 2025 - 4º trim. 2026

Renovación de vías y actuaciones puntuales y adaptación gálibos Pasos Superiores.

- Corte total: 0:00h 07/04/2026 a 23:59h 22/04/2026.
- BM con intervalo adicional 5h.
- LTV 60 km/h.

Ronda – Algeciras (2023-3-010)

(Ligado a actuaciones ladera Almagren)

(Fechas en replanificación)

Ampliación de gálibos.

- Corte total 3 meses (por determinar).

San Pablo-Almoraima (2022-3-001)

2º trim. 2025 - 2º trim. 2026

Actuación integral en Jimena de la Frontera y reposición de pasos superiores.

- 18/11/25 –30/06/26: Vía única. Corte total de 21 días. Previsión de corte en abril.

Campillos-Almagren/Cañete la Real (2025-3-001)

3º trim. 2026 – 3º trim. 2027

Actuaciones en infraestructura y gálibos.

- Corte total de 20 días.
- Previsto corte nocturno de vías de la terminal.


Almagren (2023-3-013)

(Ligado a actuaciones de autopista ferroviaria Bobadilla- Algeciras)

2026-2027 Fechas en replanificación

Estabilización de ladera de Almagren.

- Corte total de 10 meses.

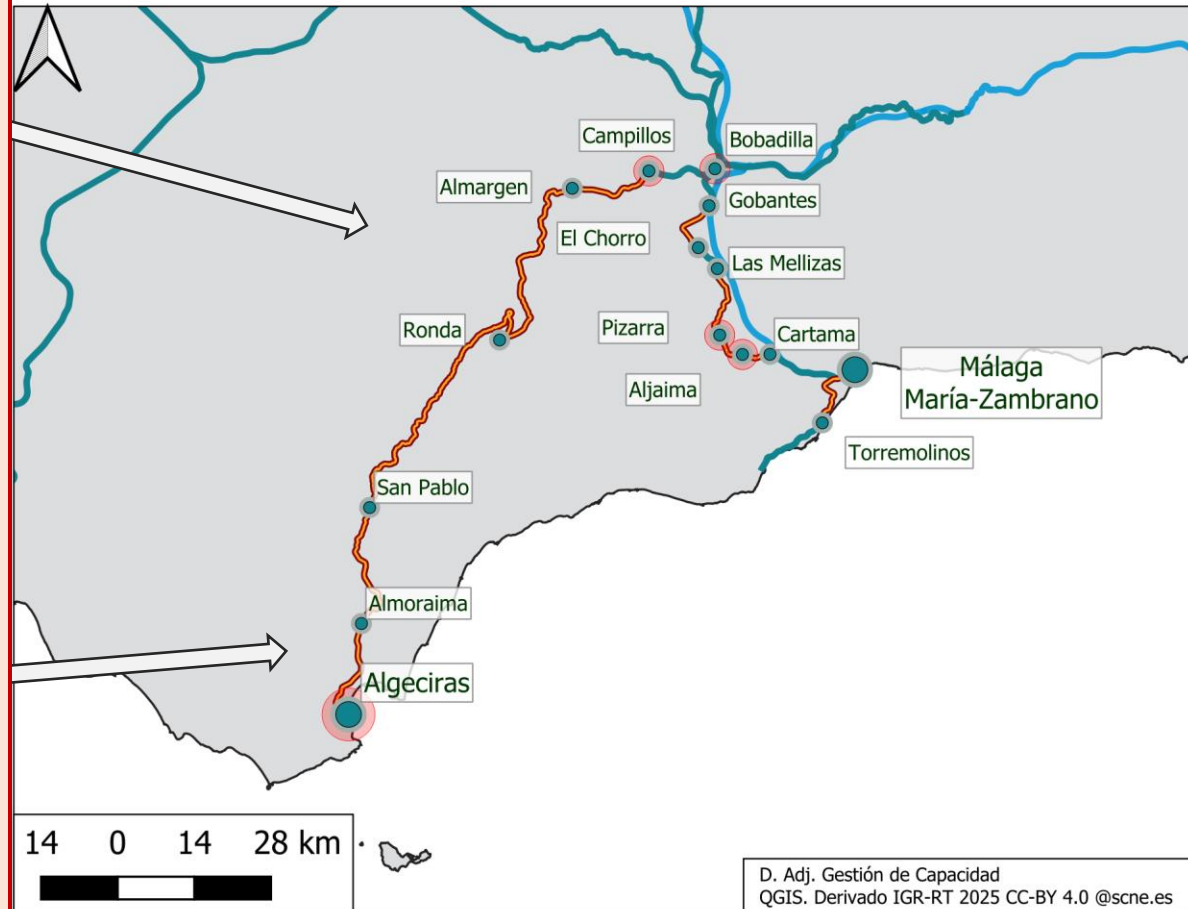

D. Adj. Gestión de Capacidad
QGIS. Derivado IGR-RT 2025 CC-BY 4.0 @scne.es


Línea 700

Luceni - Cortes de Navarra (2022-5-006)

Agosto 2026 - Febrero 2027

Terraplén PPKK 49+150 al 50+231.

- Corte de vía alterna, 3 meses cada una (LTV en vía contigua) y corte simultáneo de 5h en ambas vías en noches de V/S, S/D y D/L. No puede coincidir con corte autopista ferroviaria Guadalajara - Plasencia de Jalón.

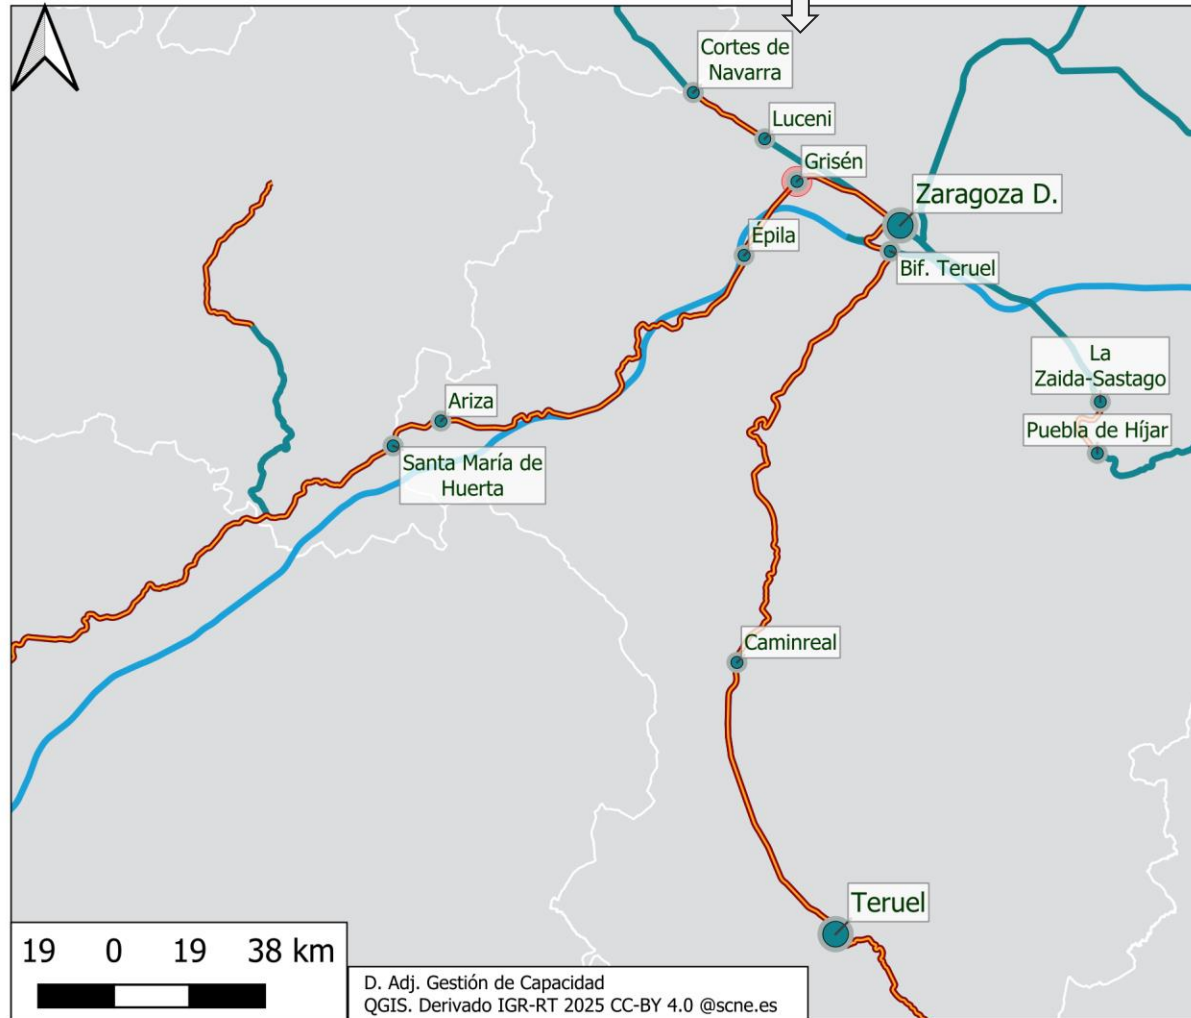

Norte (1)

Línea 100

Astigarraga-Irún (2019-6-001)

Implantación ancho mixto y adaptación de instalaciones seguridad y comunicaciones. Sustitución Paso Inferior Misericordia, demolición y montaje pasarela Teilería, trabajos en túneles Loiola, Capuchinos:


- Hernani - San Sebastián
 - 29/04/2024 - Agosto 2026: vía única por vía II. PAT.
- Andoain - Irún
 - Corte total de 00:00h 07-03-2026 a 04:30h 09/03/2026.
 - Corte total de 00:00h 14-03-2026 a 04:30h 16/03/2026.
- Hernani - Irún
 - 25/07/26 al 7/09/26: Corte total ininterrumpido.
- San Sebastián - Lezo-Rentería
 - Trabajos en túnel de Capuchinos (actuación pendiente de replanificar).

Legorreta-Tolosa (2025-6-037)

1º sem. 2026 - 2º sem. 2026

Trabajos de estabilización de terraplenes y trincheras.

- LTV a 30 km/h y después a 60 km/h (desde finales de octubre).
- Trabajos en Banda de Mantenimiento con intervalo adicional.
- Corte vía I: 00:00h 07/03/2026 a 04:30h 09/03/2026

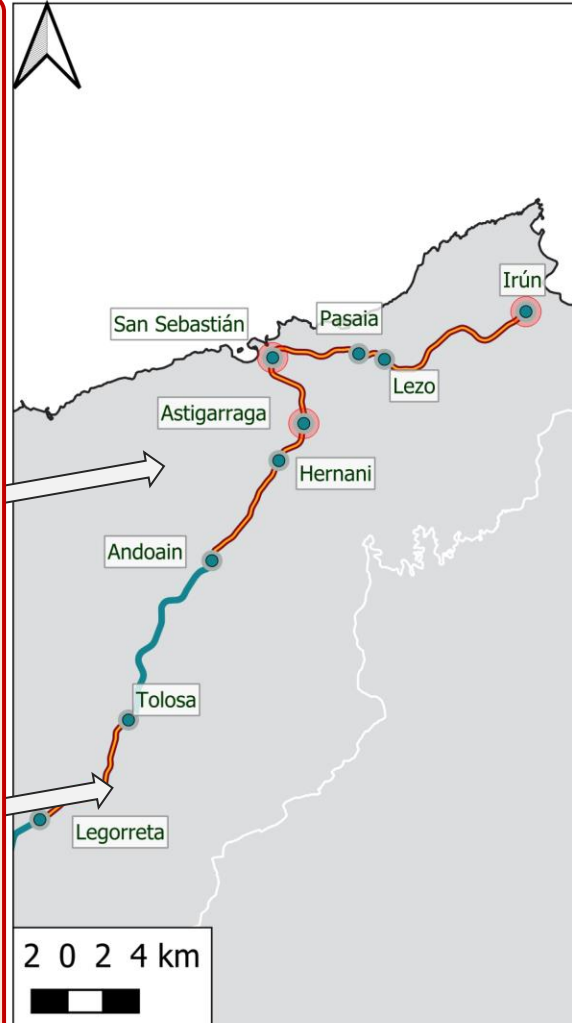

Línea 724

Bilbao Mercancías - Santurtzi

(2025-6-016)

3^{er} trim. 2027 - 4^o trim. 2027

Reparación túnel del Puerto Bilbao.

- Corte de 10 días (en agosto).



Línea 700

Bidebieta (2025-6-015)

Junio 2025 - Diciembre 2026

Cubrimiento norte, nuevo edificio viajeros y remodelación playa de vías/andenes.

- Junio 2025 - Diciembre 2026: corte vía 2.
- Corte total: 0:00h 13/06/2026 a 5:00h 19/06/2026.

Logroño -Miranda

(2021-6-036 y 2025-6-052)

2^o trim. 2027 - 4^o trim. 2027

Saneamiento de la plataforma en el túnel del Cortijo y reparación del puente sobre Najerilla:

- Actualmente LTV 10 km/h.
- Afectación futura prevista: corte total del túnel durante aprox. 6 meses (sin previsión de fecha).



D. Adj. Gestión de Capacidad
QGIS. Derivado IGR-RT 2025 CC-BY 4.0 @scne.es

Línea 100

Quintanapalla - Santa Olalla (2022-6-040)

4^o trim. 2027

Actuaciones en el túnel de la Brújula.

- Corte total 1,5 meses.
